

레이콘 시공품질관리 점검표

공사명	청운교회 교육관 신축공사	점 검 일 자	2026년 04월 02일
자재공급 공 장 명	(주)신일CM	자 재 반입량	98m3
공사감독자	소속 (주)이안알앤씨 성명 조희성 (서명)		
시 공 자	소속 (주)태상건설 성명 최영우. (서명)		
시공위치	구조물명: 지상2층 부위 : 벽체		

시공 장비 점검결과						
장 비 명	규 격	사용대수	점검결과		조치내용	
1. 펌프카	42M	1	합격			
2. 진동기	3.5~6HP	1	합격			
3. 양생기	-	-	-			
4. 기타						
품질관리 점검내용						
원재료 점검내용		점검결과			조치내용	
1. 콘크리트의 종류		보통콘크리트				
2. 시멘트의 종류		포틀랜드시멘트1종				
3. 혼화제의 종류		고성능AE감수제표준형				
4. 혼화제의 종류		플라이애시2종, 고로슬래그미분말3종				
5. 일일배합표 확인		확인				
6. 기타						
품질시험 구분		시방 기준	총검사 횟수	합격 횟수	불합격 횟수	조치내용
1. 슬럼프시험		±2.5cm	1	1	1	
2. 공기량시험		4.5±1.5%	1	1	1	
3. 염화물이온량(CI ⁻)		0.3kg/m2	1	1	1	
4. 단위수량시험		±20kg/m3	1	1	1	
5. 공시체 강도시험		-				
6. 기타						

콘크리트(슬럼프, 공기량, 염화물함유량, 압축강도) 시험일지

공 사 명 : 청운교회 교육관 신축공사

시험번호	청운교회 교육관-건축-15			시공부위	지상2층 벽체																		
시험일자	2026년 4월 2일			타 설 량	98 m3																		
콘크리트 규격	20-30-180			생 산 자	(주)신일CM																		
1. 슬럼프 시험(mm)				기준	판정																		
시험결과	S-1	180	±25mm	적합함																			
	S-2																						
	S-3																						
	S-4																						
2. 공기량 시험(%)				기준	판정																		
시험결과	S-1	4.0	4.5±1.5%	적합함																			
	S-2																						
	S-3																						
	S-4																						
3. 염화물 시험(kg/cm ²)				기준	판정																		
시험결과	S-1	0.05/0.048	0.3kg/m2	적합함																			
	S-2																						
	S-3																						
	S-4																						
4. 단위수량 시험(kg/m3)				기준	판정																		
시험결과	S-1	179.3	±20kg/m3	적합함																			
	S-2																						
	S-3																						
	S-4																						
4. 염화물 기록 sheet																							
< 생콘크리트 측정 결과 > <table style="width: 100%;"> <tr><td>1> CI</td><td style="text-align: right;">0.0260 %</td></tr> <tr><td>2> CI</td><td style="text-align: right;">0.0284 %</td></tr> <tr><td>3> CI</td><td style="text-align: right;">0.0286 %</td></tr> <tr><td>4> CI</td><td style="text-align: right;">0.0285 %</td></tr> </table> 측정항 : CI - ION 추진량 : 173 kg/m³ 염화물 : 0.0285 % 단위량 : 0.050 kg/m³ 측정일 2026.04.02. 측정자 :  < 생콘크리트 측정 결과 > <table style="width: 100%;"> <tr><td>1> CI</td><td style="text-align: right;">0.0280 %</td></tr> <tr><td>2> CI</td><td style="text-align: right;">0.0277 %</td></tr> <tr><td>3> CI</td><td style="text-align: right;">0.0275 %</td></tr> <tr><td>4> CI</td><td style="text-align: right;">0.0271 %</td></tr> </table> 측정항 : CI - ION 추진량 : 173 kg/m³ 염화물 : 0.0274 % 단위량 : 0.040 kg/m³ 측정일 2026.04.02. 측정자 : 								1> CI	0.0260 %	2> CI	0.0284 %	3> CI	0.0286 %	4> CI	0.0285 %	1> CI	0.0280 %	2> CI	0.0277 %	3> CI	0.0275 %	4> CI	0.0271 %
1> CI	0.0260 %																						
2> CI	0.0284 %																						
3> CI	0.0286 %																						
4> CI	0.0285 %																						
1> CI	0.0280 %																						
2> CI	0.0277 %																						
3> CI	0.0275 %																						
4> CI	0.0271 %																						
5. 28일 압축강도 시험 시험일시: 2026년 4월 30일																							
조	시료번호	파괴하중 (kg)	단면적 (cm ²)	평균 (MPa)	기준 (MPa)	판정	비고																
1조	S-1		78.5		30.0	적합함																	
	S-2																						
	S-3																						
2조	S-4		78.5	0.00	30.0	적합함																	
	S-5																						
	S-6																						
3조	S-7		78.5		30.0	적합함																	
	S-8																						
	S-9																						

시 험 자 : 조 희 성 (인)

감 리 원 : 이 은 기 (인)

공사 사진

공사명 : 청운교회 교육관 신축공사


제목: 슬럼프,공기량,염화물

공종: 철근콘크리트

위치: 지상2층 벽체

일시: 2026년 04월 02일

1차

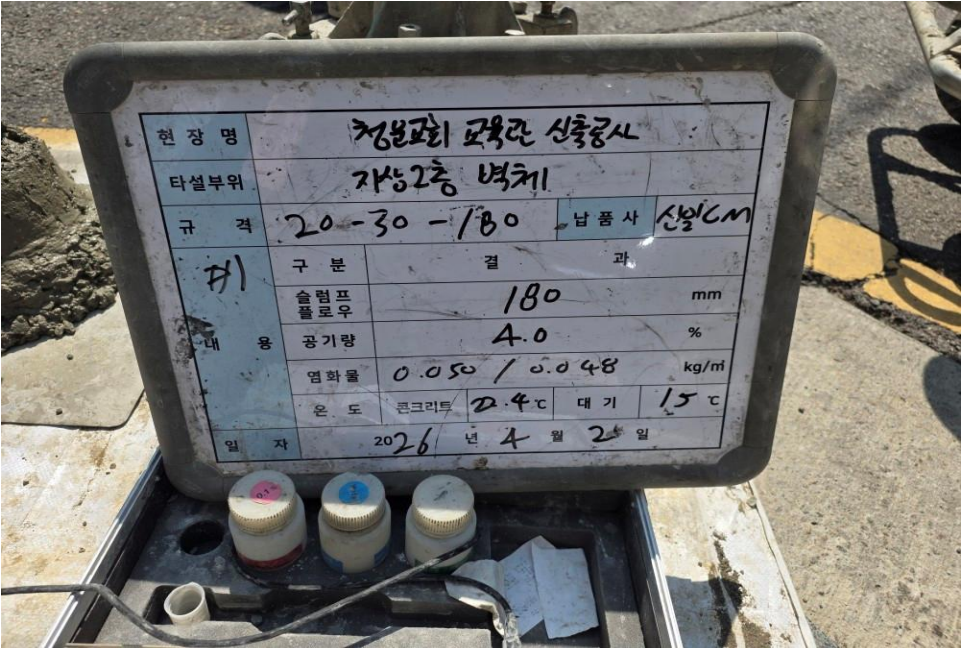

제목: 온도

공종: 철근콘크리트

위치: 지상2층 벽체

일시: 2026년 04월 02일



공사사진

공사명 : 청운교회 교육관 신축공사

제목: 공기량

공종: 철근콘크리트

위치: 지상2층 벽체

일시: 2026년 04월 02일



제목: 단위수량

공종: 철근콘크리트

위치: 지상2층 벽체

일시: 2026년 04월 02일



레미콘 현장배합표



(주)신일CM

서울 송파구 장지동 738-19번지

TEL : (02)-407-5500

FAX : (02)-406-1051

수 신 : 이안알앤씨

참 조 : 시험실

현장명 : 청운교회

□ 발송 일자 : 2026.04.02

1. 규 격 : [5510] 20-30-180

2. 시 험 자 : 김택중

(1) 시방배합표

단위질량 : 2 322 kg/m³

W/B (%)	S/a (%)	단 위 재 료 량 (kg/m³)													
		W1	W2	C1	C2	C3	C4	S1	S2	S3	20 mm	25 mm	40 mm	AD1	AD2
40.0	49.0	178	0	356	89	0	0	0	413	416	870	0	0	0.00	3.56

(2) 현장 골재 상태

S1 잔류율	S2 잔류율	S3 잔류율	G 통과율	S1 표면수율	S2 표면수율	S3 표면수율	G 표면수율	슬러지농도	회수수비율
㉑ %	㉒ 3.6 %	㉓ 3.7 %	㉔ 2.9 %	㉕ %	㉖ 6.3 %	㉗ 6.8 %	㉘ %	㉙ %	㉚ %

(3) 입 도 보 정

$$\begin{aligned}
 X1 &= \frac{100 \times S1 - d1 \times (S1 + G)}{100 - (㉑ + d1)} = \frac{100 \times 413 - 1.4448 \times (413 + 870)}{100 - (3.6 + 1.4448)} = 415 \text{ kg/m}^3 \\
 X2 &= \frac{100 \times S2 - d2 \times (S2 + G)}{100 - (㉒ + d2)} = \frac{100 \times 416 - 1.4552 \times (416 + 870)}{100 - (3.7 + 1.4552)} = 419 \text{ kg/m}^3 \\
 X3 &= \frac{100 \times S3 - d3 \times (S3 + G)}{100 - (㉓ + d3)} = \frac{100 \times 870 - 3.7 \times (870 + 413)}{100 - (2.9 + 3.7)} = 865 \text{ kg/m}^3 \\
 Y &= \frac{100 \times G - ㉔ \times (G + S1)}{100 - (d1 + ㉔)} + \frac{G \times d2 - S2 \times ㉒}{100 - (d2 + ㉒)} + \frac{G \times d3 - S3 \times ㉓}{100 - (d3 + ㉓)} \\
 &= \frac{100 \times 89 - 2.9 \times (89 + 413)}{100 - (3.6 + 2.9)} + \frac{870 \times 1.4448 - 413 \times 3.6}{100 - (1.4448 + 3.6)} + \frac{870 \times 1.4552 - 416 \times 3.7}{100 - (1.4552 + 3.7)} \\
 &= 865 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

(d1) : ㉑ × S1 사용비율
(d2) : ㉒ × S2 사용비율
(d3) : ㉓ × S3 사용비율

(4) 입도 및 표면수를 고려한 보정

$$\begin{aligned}
 X1' &= \frac{X1 \times (100 + ㉑)}{100} = \frac{0 \times (100 + ㉑)}{100} = 0 \text{ kg/m}^3 \\
 X2' &= \frac{X2 \times (100 + ㉒)}{100} = \frac{415 \times (100 + 6.3)}{100} = 441 \text{ kg/m}^3 \\
 X3' &= \frac{X3 \times (100 + ㉓)}{100} = \frac{419 \times (100 + 6.8)}{100} = 447 \text{ kg/m}^3 \\
 Y' &= \frac{Y \times (100 + ㉔)}{100} = \frac{865 \times (100 + ㉔)}{100} = 865 \text{ kg/m}^3 \\
 Z' &= \{100 \times W - (㉑ \times X1 + ㉒ \times X2 + ㉓ \times X3 + ㉔ \times Y)\} / 100 \\
 &= \{100 \times 178 - (6.3 \times 415 + 6.8 \times 419 + 2.9 \times 865)\} / 100 = 123 \text{ kg/m}^3
 \end{aligned}$$

(5) 현장 배합표 [골재수정계수 : 0.2 %]

W/B (%)	S/a (%)	단 위 재 료 량 (kg/m³)													
		W1	W2	C1	C2	C3	C4	S1	S2	S3	20 mm	25 mm	40 mm	AD1	AD2
40.0	49.0	123	0	356	89	0	0	0	441	447	865	0	0	0.00	3.56

비 고

품질관리실장 : 지대일

